



**INFORME**  
**I-2023-27647 | AEV/DIR.SCZ/AAF\_ INF/Nro.0124/2024**

**A** : Arq. Freddy Choquetarqui Apaza  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD**

**DE** : Arq. Ronald Arze Sejas  
**TECNICO II EN DISEÑO I**

Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano  
**TECNICO III EN CONTRATACIONES II**

**COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

**REF.** : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(VIII) 2023- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 040/2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**FECHA** : Santa Cruz, 27 de Marzo de 2024

**1. ANTECEDENTES**

- **Solicitud de proceso de contratación:** Mediante Informe I-2023-27647 AEV/DIR.SCZ/AGP\_INF/Nro.0082/2024 de fecha 16 de Febrero de 2024, la Unidad de Gestión de Proyectos a través del Arq. Ronald Arze Sejas realizó la SOLICITUD DE SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACION "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(VIII) 2023- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 040/2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA).
- **Solicitud de Aprobación del Documento de Contratación Directa DCD:** Mediante nota interna I-2023-27647 AEV/DIR.SCZ/AAF\_NOT/Nro.0172/2024 de fecha 11 de Marzo de 2024, el Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano solicita al Responsable de Contratación Directa RCD la aprobación de DCD; en fecha 12 de Marzo de 2024, mediante Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 038/2024 el RCD aprobó el Documento de Contratación Directa del proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(VIII) 2023- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 040/2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
- **Publicación:** El Documento de Contratación Directa fue publicado en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 12 de Marzo de 2024.
- **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante memorándum AEV/RCD/N° 036/2024 de fecha 19 de Marzo de 2024 se designaron a los funcionarios la Arq. Ronald Arze Sejas con cargo



**¡Construyendo nuevos sueños!**

de Técnico II en Diseño I y el Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano con cargo Técnico III en Contrataciones II como miembros de la comisión de evaluación y calificación.

- **Invitación a la Unidad de Transparencia y al Área Jurídica:** en fecha 19 de Marzo de 2024, se cursó invitación vía correo institucional a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y al Área Jurídica de la Departamental Santa Cruz, para la participación del Acto de Apertura de propuestas.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 11:00 A.M. del 20 de Marzo de 2024 se presentaron los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	20/03/2024	10:24 A.M.

- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de la propuesta en la fecha y hora establecida en la convocatoria, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas respectiva.

## 2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 31 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información del proponente en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentra impedidos de participar en procesos de contratación.

### a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Nº	PROPONENTE	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	SIN REGISTROS	SIN REGISTROS

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

### b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

**¡Construyendo  
nuevos sueños!**



Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	SIN REGISTROS

Según el cuadro anterior, el proponente no está impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

**c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):**

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	SIN REGISTROS

Según el cuadro anterior, el proponente no está impedido de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

**d) Verificación Deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda:**

Se verificó que el proponente no tenga cuentas pendientes con la AEVIENDA, en el detalle actualizado al 29/09/2022 obtenido de la página oficial de la AEVIENDA [www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo), encontrándose lo siguiente:

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	SIN REGISTROS

Se adjunta el anexo 4, información recuperada de la página oficial de la AEVIENDA [www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo) en fecha 27/03/2024.

**3. EVALUACIÓN DE PROPUESTA**

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar la propuesta según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

**3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR**

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si la propuesta continua o descalifica aplicando el siguiente formulario:

- **ASOCIACION ACCIDENTAL CESPEDES MORON ASOCIADOS**

**FORMULARIO V-1b  
EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Asociaciones Accidentales)**

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSO DE GUARAYOS -FASE(VIII) 2023- SANTA CRUZ"



**¡Construyendo nuevos sueños!**

Nombre del Proponente :	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL
Número de Páginas de la propuesta :	197 FOJAS
Propuesta económica :	Bs.- 2.305.184,05

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS</b>					
1. <b>Formulario A-1.</b> Presentación de Propuesta	SI		3-4	CONTINUA	
2. <b>Formulario A-2b.</b> Identificación del Proponente.	SI		6-22	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	SI		S/F	CONTINUA	
4. <b>Formulario A-4.</b> Hoja de Vida del Personal.	SI		26-52	CONTINUA	
5. <b>Formulario B-1.</b> Propuesta Económica.	SI		54-57	CONTINUA	
6. <b>Formulario C-1.</b> Propuesta Técnica.	SI		59-132	CONTINUA	
7. <b>Formulario C-2.</b> Condiciones Adicionales.	SI		134-135	CONTINUA	
<b>Además cada socio en forma independiente presentará:</b>					
8. <b>Formulario A-2c</b> Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	SI		137-160	CONTINUA	
9. <b>Formulario A-3.</b> Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		162-197	CONTINUA	

El proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL** cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de Propuesta; por lo expuesto, se determina que continua a la siguiente etapa de evaluación.

### 3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento con el numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de Calidad, Propuesta, Técnica y Costo, asignando el siguiente puntaje:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Económica (PE) : 30 puntos  
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) : 70 puntos

#### 3.2.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS)

**¡Construyendo  
nuevos sueños!**

**Errores Aritméticos:** En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:

### EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL PROCESO				
Objeto de la Contratación		PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(VIII) 2023- SANTA CRUZ"		
N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMETICA	PUNTAJE PROPUESTA ECONOMICA (30 PUNTOS.)
		pp	MAPRA (*)	$PE_i = \frac{PAMV + 30}{[TPA]_i}$
1	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	Bs.- 2.305.184,05	Bs.- 2.305.184,05	30 PUNTOS

Como se observa en el cuadro anterior, las propuestas económicas de los proponentes **ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL**, no se evidencia errores aritméticos.

### 3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (70 PUNTOS)

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 20.2. del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica del proponente que quedo habilitado para esta etapa.

#### FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

EXPERIENCIA	PROPONENTE	
	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	
	Cumple	No cumple
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente.	CUMPLE	
Formulario A-4 Hoja de Vida, del Personal	CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	

Formulario C-1 (Llenado por la Entidad)	PROPONENTE	
	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	
	Cumple	No cumple
Propuesta Técnica	CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	

CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad)	Puntaje Asignado	PROPONENTE
		ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL



		Puntaje Obtenido
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD EJECUTORA.</b> Cuando el proponente demuestre un monto superior al monto mínimo requerido en la experiencia específica, se asignará 2 Puntos por cada 0.5 veces adicionales, hasta un máximo de 10 puntos. <b>(Para la puntuación solo se tomará en cuenta experiencia en el Sector Público)</b>	10	El proponente adicional al monto mínimo presenta <b>5.83 veces</b> a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto, corresponde el puntaje de:  <b>10 puntos</b>
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA)</b> Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	6	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>33 meses</b> . Por lo tanto, corresponde el puntaje de:  <b>6 puntos</b>
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA: EDUCADOR SOCIAL</b> Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	6	El proponente presenta un EDUCADOR SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>31 meses</b> . Por lo tanto, corresponde el puntaje de:  <b>6 puntos</b>
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO ALMACENERO</b> Se asignará un 1 punto por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 3 puntos.	3	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>25 meses</b> . Por lo tanto, corresponde el puntaje de:  <b>3 puntos</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAL ADICIONAL</b> Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil adicional, hasta un máximo de 3 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	3	El proponente presenta <b>3 albañiles adicionales</b> al personal requerido. Por lo tanto, corresponde el puntaje de:  <b>3 puntos</b>
<b>PARTICIPACIÓN DE PERSONAL FEMENINO</b> Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil femenino, hasta un máximo de 2 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	2	El proponente presenta <b>2 albañiles femeninos adicionales</b> al personal requerido. Por lo tanto, corresponde el puntaje de:  <b>2 puntos</b>
<b>EQUIPOS/MAQUINARIA, VEHÍCULOS y OTROS</b> La calificación se realizará al <b>Equipo Permanente</b> propuesto de acuerdo al siguiente detalle: • A la Propuesta que oferte más Camionetas se le asignará <b>2 Puntos</b> , al resto de propuesta se asignará el	5	El proponente presenta 2 camionetas y 2 volqueta adicionales a lo mínimo requerido por lo que se le asignará el puntaje de:  <b>5 puntos</b>
	2	



puntaje directamente proporcional. • A la Propuesta que oferte más Volquetas y/o Camiones se le asignará <b>3 Puntos</b> , al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional.	3	
<b>PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES</b>	<b>35</b>	<b>35 puntos</b>

**Nota: La Comisión de Evaluación y Calificación obligatoriamente, deberá realizar la justificación del puntaje obtenido producto de la evaluación, por cada condición adicional propuesta de cada proponente.**

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE ASIGNADO	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL
Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE	35	35
Puntaje de las Condiciones Adicionales	35	35
<b>PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

### 3.2.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

En cumplimiento con el numeral 20.3 del Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación ha determinado el puntaje total aplicando el formulario V-4

#### FORMULARIO V-4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE ASIGNADO
PE	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	30 puntos
PT	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	70 puntos
<b>PTP</b>	<b>PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA</b>	<b>100 puntos</b>

RESUMEN DE EVALUACIÓN	PROPONENTE	
	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL	
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	30	
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	70	
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100</b>	





De acuerdo a los resultados finales, se determina que la propuesta del proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL** obtuvo 100 sobre 100 puntos, resultando ser la mejor calificada en el presente proceso de contratación.

**4. CONCLUSIÓN**

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la propuesta presentada por el proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL** alcanzó un puntaje 100 sobre 100 puntos y cumplió con todas las condiciones establecidas en el DCD, resultando calificada en el presente proceso de contratación.

**5. RECOMENDACIÓN**

Se recomienda a su autoridad, **ADJUDICAR** al proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL** al proceso de contratación directa: **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS - FASE(VIII) 2023- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 040/2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA)** por un monto de Bs.- 2.305.184,05.- (Dos Millones Trescientos Cinco mil cientos ochenta y cuatro, 05/100 bolivianos) en el que se detalla cada componente en el siguiente cuadro:

Nro.	COMPONENTES	Monto Bs.-
1	Provisión / Dotación de Materiales de Construcción	1.985.070,25.-
2	Capacitación, Asistencia Técnica, Seguimiento	320.113,80.-
<b>TOTAL AMBOS COMPONENTES</b>		<b>2.305.184,05.-</b>

Por un plazo de ejecución de obra de **150** días calendario computables desde la orden de proceder emitida por el Inspector de Obra, por haber obtenido 100 sobre 100 puntos, de acuerdo a su propuesta presentada y cumplido con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa DCD y los Términos de Referencia.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.  
Por la Comisión de Evaluación y Calificación:

Firma/Sello

Firma/Sello

RAS/FRES  
Cc: arch. - exp.







## ANEXO 1 SICOES

### • ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL

### MIGMEN

### DESESTIMIENTO DE CONTRATOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

#### DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NIT/CI: 7580143016

Tipo de desistimiento: Selecciona Fecha de desistimiento: 30/09/2016 y 30/09/2016

CUCE: El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Juridica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados

Si hay un contrato o registros

### CONTRATOS RESUELTOS

SICOES Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compra Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

#### CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado: NIT/CI: 7580143016

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Selecciona Fecha de resolución del contrato: 30/09/2016 y 30/09/2016

CUCE: Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
--------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	--------

No hay datos registrados

Si hay un contrato o registros



¡Construyendo  
nuevos **sueños!**

## CONSULTORA Y CONSTRUCTORA TIMOES S.R.L.

### DESESTIMIENTO DE CONTRATOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes - RUPE - Normativa - Incumplidos - Clasificadores - Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

#### DESESTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NIT/CI: 296826025

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: y

CUCE: El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Juridica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados

Se han encontrado 0 registros

### CONTRATOS RESUELTOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes - RUPE - Normativa - Incumplidos - Clasificadores - Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

#### CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razon Social del contratado: NIT/CI: 296826025

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito • Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: y

CUCE:

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
296826025	Consultora & Constructora Timoes S.R.L.	Gobierno Autónomo Municipal De Botocera	const. infraestructura tres estancias Botocera (CUCE 22-1903-00-1294331-3-E)	109.837.106	4-11-22	15-5-23	Contratante (Entidad)	Negligencia referada en el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas / terminos de referencia / atención del servicio

Se han encontrado 1 registros



## ANEXO 2 SIMCO

### ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL

- MIGMEN

#### PROPONENTE DESISTIDO

Simco / Contratacion /

REGISTRAR / Completar los datos para registrar la proposición desistida.

Nombre Proposición

MOTIVO

FECHA DE DESISTIMIENTO: 2013/02/14

PROYECTO

CAPITAL ATRIBUIBLE

REGISTRAR

Nombre Usuario (Contratante): AGO

LINK: PROPOSICIONES DESISTIDAS

Estado: Desistida

Nombre Proposición: [Campo vacío]

Fecha de Registro: [Campo vacío]

Fecha de Desistimiento: [Campo vacío]

Capital Atribuible: [Campo vacío]

Nombre Usuario (Contratante): [Campo vacío]

Nombre Usuario (Proponente): [Campo vacío]

Nombre Usuario (Proveedores): [Campo vacío]

Nombre Usuario (Otro): [Campo vacío]

Fecha de Registro: [Campo vacío]

- CONSULTORA Y CONSTRUCTORA TIMOES S.R.L.  
PROPONENTE DESISTIDO



Simco / Contratacion /

REGISTRAR / Completar los datos para registrar la proposición desistida.

Nombre Proposición

MOTIVO

FECHA DE DESISTIMIENTO: 2013/02/14

PROYECTO

CAPITAL ATRIBUIBLE

REGISTRAR

Nombre Usuario (Contratante): AGO

LINK: PROPOSICIONES DESISTIDAS

Estado: Desistida

Nombre Proposición: [Campo vacío]

Fecha de Registro: [Campo vacío]

Fecha de Desistimiento: [Campo vacío]

Capital Atribuible: [Campo vacío]

Nombre Usuario (Contratante): [Campo vacío]

Nombre Usuario (Proponente): [Campo vacío]

Nombre Usuario (Proveedores): [Campo vacío]

Nombre Usuario (Otro): [Campo vacío]

Fecha de Registro: [Campo vacío]



**¡Construyendo**  
nuevos **sueños!**



## PERSONAL CLAVE

### a. TECNICO OPERATIVO DE AREA TOA

Contratación / NUEVA BUSQUEDA  
Criterios de Búsqueda: 7595885

Impresión pantalla como requisito: AQUÍ

Lista: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

DESAROLLO	NOMBRE TECNICO	NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	MINICE	Área	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OPERACIONES PERSONAL CLAVE
OPERANDO	...	...	...	100.00%	10.4%	...	...

### b. EDUCADOR SOCIAL

Contratación / NUEVA BUSQUEDA  
Criterios de Búsqueda: 10790049

Impresión pantalla como requisito: AQUÍ

Lista: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

DESAROLLO	NOMBRE TECNICO	NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	MINICE	Área	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OPERACIONES PERSONAL CLAVE
OPERANDO	...	...	...	100.00%	17.4%	...	...

### c. TECNICO ALMACENERO

Contratación / NUEVA BUSQUEDA  
Criterios de Búsqueda: 1933369-1D

Impresión pantalla como requisito: AQUÍ

Lista: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

DESAROLLO	NOMBRE TECNICO	NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	MINICE	Área	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OPERACIONES PERSONAL CLAVE
OPERANDO	...	...	...	100.00%	30.7%	...	...



¡Construyendo nuevos sueños!


### ANEXO 3 CMI

## ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL

- MIGMEN



- CONSULTORA Y CONSTRUCTORA TIMOES S.R.L.

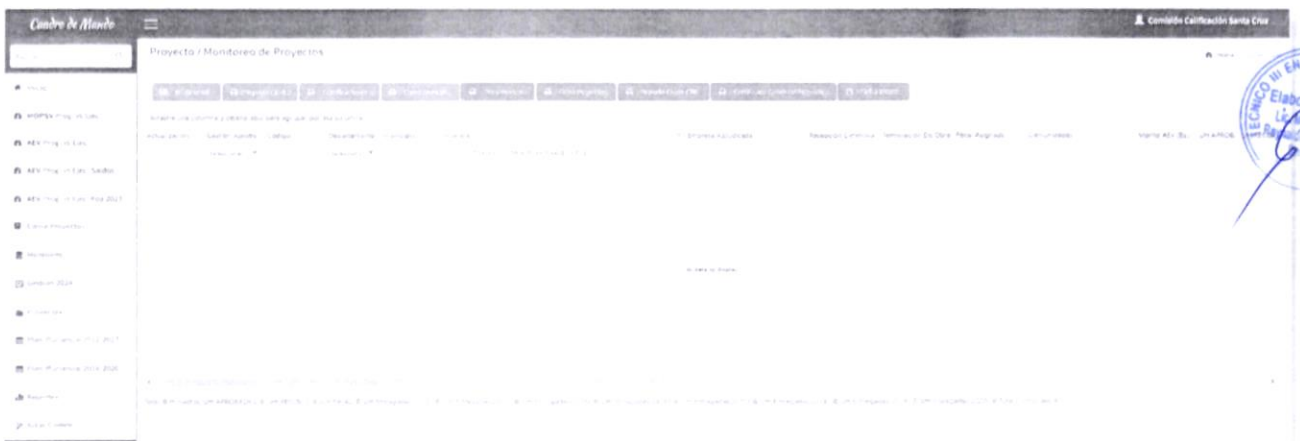

**¡Construyendo nuevos sueños!**

### ANEXO 4 EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIVIENDA ACTUALIZADO 29/09/2022

Nº	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BNI0001	BENI	TORITO	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUANDONOMA DEL MUNICIPIO DE TORITO-BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNI0007	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE 47 VIVIENDAS PARA LOS GRUPOS DE RIESGOS EN SAN BORJA-BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNI0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YACUMA-BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2015	AEV-BNI0073	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YACUMA-BENI	EMPRESA VIRTUDEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRI	20/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNI0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN-BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA MAN&MOL Y CONSULTORA MAN&MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNI0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE JOAQUIN-BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA USUENVAS S.R.L		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2016	AEV-BNI0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SUICORCAVINI) S.O.- BENI	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2017	AEV-BNI0153	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SUICORCAVINI) S.O.- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA EL ESTI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2015	AEV-BNI0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA ALTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (EASLXXXVI) 2016-BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTIDORA Y SERVICIOS VALRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNI0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA (EASLXXXI) 2019-BENI	INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES PULAS R.T	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2019	AEV-BNI0288	BENI	TRINIDAD	CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (EASLXXXVI) 2019-BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARIAN(CIAT) CIATCI- ARK/2)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2015	AEV-CHA0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DEL RIO DE LA MUJERITA - COCHABAMBA (EASLII)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CHA0036	COCHABAMBA	SIBU SIBU	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIBU SIBU - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CHA0041	COCHABAMBA	MOROCAYATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCAYATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	27/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CHA0046	COCHABAMBA	TARAJA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 113 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARAJA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASKI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2014	AEV-CHA0050	COCHABAMBA	PROO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PROO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2015	AEV-CHA0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 17 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEI Instituto de Investigacion Cultural para Educacion Popular	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2014	AEV-CHA0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YANIL PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CHA0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (EASLII) 133 - COCHABAMBA (EASLII)	ASOCIACION ACCIDENTAL DEL PROPIO ASOCIACION ACCIDENTAL	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CHA0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (EASLII) ZONA I	2M MENARQ S.R.L	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CHA0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CIBOLA - COCHABAMBA	PROCASTIA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CHA0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL CARU	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CHA0119	COCHABAMBA	LAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAPACARI - COCHABAMBA (EASLII)	CONVCONSTR	14/04/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CHA0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RE-NOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA II) - COCHABAMBA (EASLII)	F.O.C PROJECCIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



**¡Construyendo nuevos sueños!**

Nº	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
25	2016	AEV-CHA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VIELARROB	ATENCIONES EXTRAORDINARIAS DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VIELARROB - COCHABAMBA (FAS I)	CONSULTORA & SERVICIOS INRAZ (AMAYO)	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CHA-0150	COCHABAMBA	VINCO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINCO - COCHABAMBA (FAS I)	CONSTRUCTORA ARMENTAS S.R.L	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CHA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FAS II)	YPA (YANEZ/PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CHA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FAS IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CHA-0162	COCHABAMBA	VINCO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINCO - COCHABAMBA (FAS I)	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CHA-0163	COCHABAMBA	VINCO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINCO - COCHABAMBA (FAS III)	FUCASANS S.R.L	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
31	2017	AEV-CHA-0223	COCHABAMBA	COCAJATA	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAJATA - FAS I - V 2017 - COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
32	2019	AEV-CHA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA - FAS I - XV 2019 - COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCOS S.R.L	11-12-2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MADRE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 107 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MADRE - LA PAZ	EL CAJAL IMPRESA Y CONSTRUCCIONES AGRIETA	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 17 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSCRUZ S.R.L	3/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FAS II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL HUAFISTA - GARDUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSCRUZ S.R.L	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO - FAS II - LA PAZ	CAJOVA CONSTRUCCIONES S.R.L	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO - FAS II - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA DIVERSIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	AI TOLENE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE AI TOLENE - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDE	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2018	AEV-LPZ-0306	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FAS I - XV 2018 - LA PAZ	EMPRESA UNIVERSAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2019	AEV-LPZ-0609	LA PAZ	GRANAY CARANAVI COBROCO	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE GRANAY/ LA CARANAVI/ LA COBROCO/ LA PAZ - FAS I - VIII 2019 - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MARIAMAY (FEBRERO 1998) - EMPRESA CONSTRUCTORA ASATE 1961	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2015	AEV-ORO-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FAS II) - ORURO	Empresa Constructora Rumor Songo S.R.L	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOCAYUNA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOCAYUNA - PANDO	EMPRESA CONSTRUCTORA DAIN & COS S.R.L	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SAN LUIS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GAMBORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA - FAS I - XV 2019 - SANTA CRUZ	MUTACION S.R.L	11/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JORGE CHUPILLOS	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE CHUPILLOS - FAS I - VIII 2019 - SANTA CRUZ	NEVA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO - FAS I - IV 2019 - SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL COSIS SALTILERO	29/09/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FAS I - XIV 2019 - SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSARI	07/10/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2019	AEV-SCZ-0483	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FAS I - XIV 2019 - SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA MEGA BUILDERS S.R.L	26/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARPES	PROYECTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARPES - FAS I - VIII 2019 - SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GLAYACAN LTDA	26/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2015	AEV-TJA-0020	TARJA	HERMOSO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSO - FAS II - TARJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACOS S.R.L	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2015	AEV-TJA-0020	TARJA	HERMOSO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSO - FAS II - TARJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACOS S.R.L	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



**¡Construyendo nuevos sueños!**

Nº	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO.	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
53	2014	ALV-LJA-0022	TARDA	YACUBA	MEJORAMIENTO AMPLIACION Y OBRAS DE RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUBA - TARDA	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL ASMA OCUA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2014	ALV-LJA-0026	TARDA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 90 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - TARDA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVAL COSRE	11/09/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2015	ALV-LJA-0037	TARDA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO AMPLIACION Y OBRAS DE RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTONATO QUEMADA MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARDA	ASOCIACION INTEGRAL EN SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS A.E. SRE	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	ALV-LJA-0037	TARDA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO AMPLIACION Y OBRAS DE RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTONATO QUEMADA MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARDA	ASOCIACION INTEGRAL EN SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS A.E. SRE	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	ALV-LJA-0046	TARDA	VILLA MONTES	PMAC 42 VIVIENDAS DISTRITO 9 MUNICIPIO VILLA MONTES - TARDA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2015	ALV-LJA-0046	TARDA	VILLA MONTES	PMAC 42 VIVIENDAS DISTRITO 9 MUNICIPIO VILLA MONTES - TARDA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2016	ALV-LJA-0074	TARDA	CARAPARI	MEJORAMIENTO CON AMPLIACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARDA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS DAIRE TO GUERRA	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2016	ALV-LJA-0074	TARDA	CARAPARI	MEJORAMIENTO CON AMPLIACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARDA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS DAIRE TO GUERRA	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
61	2019	ALV-LJA-0158	TARDA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI (ASIA) DEL 2019 - TARDA	ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL CONSTRUCTORA DE OBRAS S.R.L. (EMPRESA UNIPERSONAL)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
62	2016	ALV-LJA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO AMPLIACION Y OBRAS DE RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO COCHABAMBA (ASIA) DEL 2016	ECOASANS S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO

**LA EMPRESA ASOCIACION ACCIDENTAL ORIENTAL. NO TIENE DEUDAS PENDIENTES CON LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA.**

*[Firma]*  
Lc. MS. Franco Serrano  
TECNICO III EN DISEÑO II  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

*[Firma]*  
Arq. Ronald Arze Sejas  
Técnico II en diseño I  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**¡Construyendo nuevos sueños!**
